



Informe que rinde la Unidad Técnica de
Cómputo sobre el avance de la empresa
Grupo PROISI S.A. de C.V. en la
implementación del Programa de Resultados
Electtorales Preliminares

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018

Unidad Técnica de Cómputo

25-ABR-2018

CONTENIDO

CONTENIDO	2
Avance en la Implementación del PREP Grupo PROISI S.A. de C.V.	3
I. RECURSOS HUMANOS	3
a. Personal para Centro de Verificación	3
b. Personal para Centro de Acopio y Transmisión de Datos	3
II. INFRAESTRUCTURA	4
a. Centro de Verificación	4
b. Centro de Acopio y Transmisión de Datos	4
III. SISTEMAS Y SOFTWARE	5
IV. CENTRO DE DATOS PRIMARIO	5
V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	6
a. Entrega del Centro de Cómputo	6
b. Instalación de piso	7
c. Colocación de tabla roca	8
d. Colocación de aire acondicionado	9
e. Instalación eléctrica	10
f. Centro de cómputo	11
g. CATD Durango (instalación de tabla roca)	12
h. CATD Cuencamé	12
i. CATD Santiago Papasquiaro	13
j. CATD El Oro	13
k. CATD Nombre de Dios	14

Avance en la Implementación del PREP Grupo PROISI S.A. de C.V.

I. RECURSOS HUMANOS

a. Personal para Centro de Verificación

REQUERIDO	CONTRATADO
1 Líder de proyecto 1 Administración 5 Desarrollo de Sistemas 3 Coordinadores de zona 1 Coordinador (Zona Lerdo y Gómez) 3 Soporte técnico 2 Desarrolladores web 2 Soporte telecomunicaciones 1 Asesor de software 30 Validadores 1 Coordinador validadores	1 Líder de proyecto 1 Administración 5 Desarrollo de Sistemas 3 Coordinadores de zona 3 Soporte técnico 2 Desarrolladores web 2 Soporte telecomunicaciones 1 Asesor de software 1 Coordinador de validadores
Avance de contratación: 60%	

b. Personal para Centro de Acopio y Transmisión de Datos

REQUERIDO	CONTRATADO
9 Coordinador/Capturista (1 por distrito) 23 Capturistas 12 Acopiadores	Presidentes de CM recomendando gente
Avance de contratación: 0% (Se comenzará con el reclutamiento y selección a partir de la segunda quincena de abril).	



II. INFRAESTRUCTURA

a. Centro de Verificación

REQUERIDO	AVANCE
• 3 Servicios de internet • 5 Líneas telefónicas • 32 Equipos de cómputo • 2 Impresoras • Instalación de red • Instalación eléctrica • Equipos de aire acondicionado	• 2 Servicios de internet • 3 Línea telefónica • 32 Equipos de cómputo • 2 Impresoras • Instalación de red • Instalación Eléctrica • 2 Mini Split 2 ton.
Avance: 90%	

b. Centro de Acopio y Transmisión de Datos

REQUERIDO	AVANCE
Entrega de equipo (Mesas, Equipo de soporte para suministro eléctrico UPS No-Break, Equipo para digitalización de actas, equipos de cómputo, aparatos telefónicos, entre otros) 9 CATD	Se ha entregado equipo en los CATD de: ✓ Nombre de Dios ✓ Gómez Palacio ✓ El Oro ✓ Santiago Papasquiaro ✓ Cuencamé ✓ Mapimí ✓ Gómez Palacio ✓ Lerdo ✓ Durango En el CATD ubicado en el Consejo Electoral Municipal de Durango se cuenta con avance en las adecuaciones de las instalaciones, está en revisión las instalaciones eléctricas y ya se ha realizado la instalación de un muro de tabla roca para delimitar el área designada.
Avance de entrega de equipo: 90%	



Ya se solicitó la instalación de líneas telefónicas y servicio de internet para cada uno de los distritos, sin embargo, se encuentra en espera de la instalación por parte de los proveedores.

III. SISTEMAS Y SOFTWARE

REQUERIDO	AVANCE
• Sistema de Captura • Sistema de Validación • Aplicación PREP Casilla • Sitio de Publicación	• Sistema de Captura con base de datos temporal • Sistema de Validación • Aplicación PREP Casilla con base de datos temporal • Sitio de Publicación con base de datos temporal
Avance: 70%	

El desarrollo de sistemas y software para el PREP se encuentra en espera de información tal como base de datos de casillas, nombres de candidatos, partidos, coaliciones, entre otros, ya que, debido a las etapas del proceso electoral, aún no se cuenta con dicha información.

IV. CENTRO DE DATOS PRIMARIO

REQUERIDO	AVANCE
Servicio de procesamiento de datos Servicio de almacenamiento de datos Servicio para Interfaz de Programa de Aplicaciones	Los servicios ya se han contratado y se encuentran configurados, se está terminando la implementación de los aplicativos en los servicios contratados (servidores).
Avance: 70%	



V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

a. Entrega del Centro de Cómputo



Imagen 1



Imagen 2



b. Instalación de piso



Imagen 3



Imagen 4

c. Colocación de tabla roca



Imagen 5

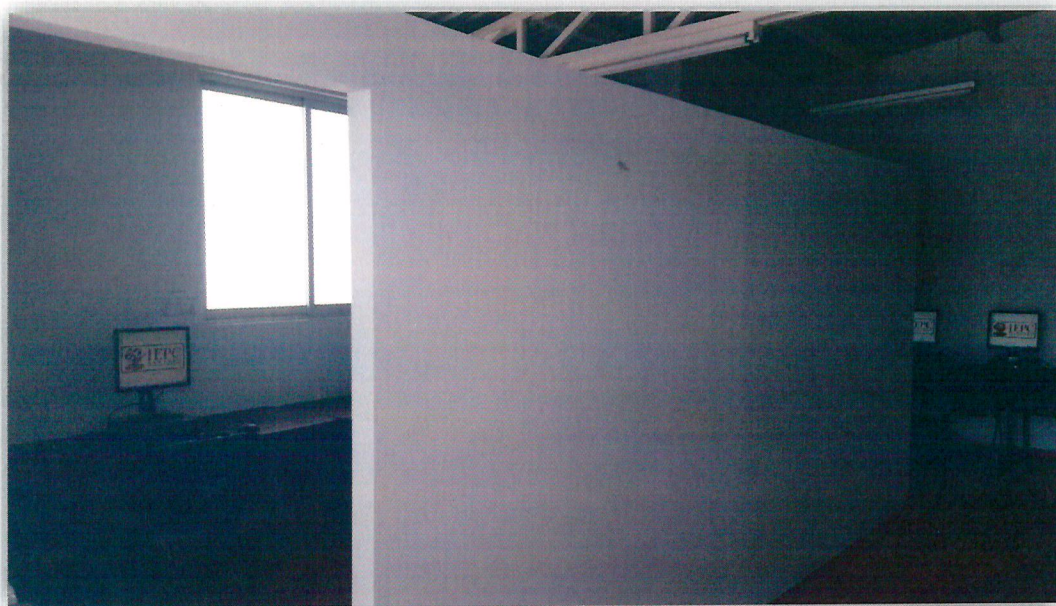


Imagen 6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

d. Colocación de aire acondicionado



Imagen 7



Imagen 8



e. Instalación eléctrica



Imagen 9



Imagen 10

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

f. Centro de cómputo



Imagen 11



Imagen 12



g. CATD Durango (instalación de tabla roca)

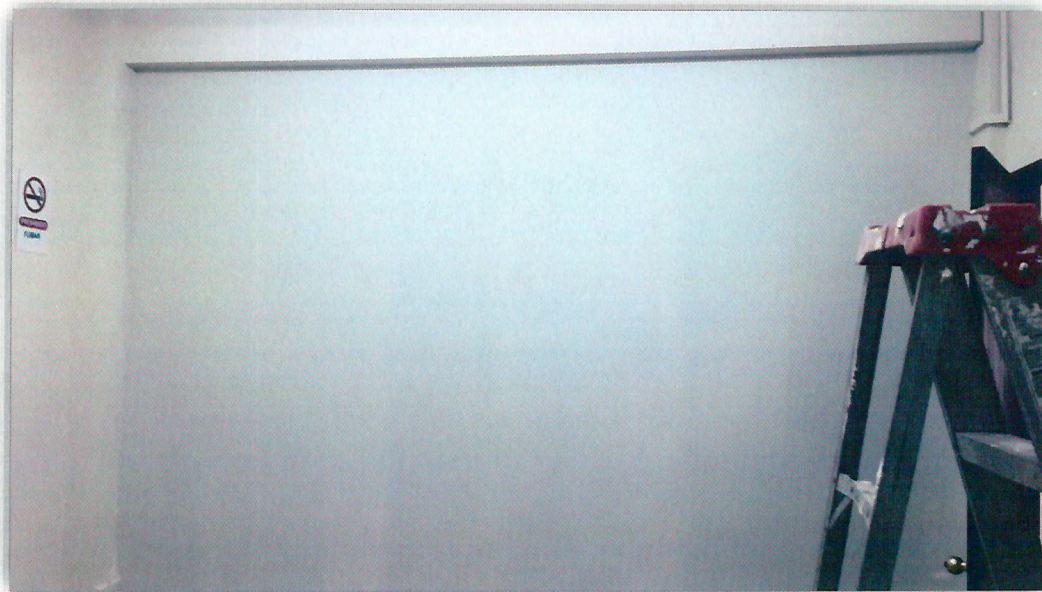


Imagen 13

h. CATD Cuencamé



Imagen 14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

i. CATD Santiago Papasquiaro



Imagen 15

j. CATD El Oro



Imagen 16

k. CATD Nombre de Dios



Imagen 17

